	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1	Kloakfornyelse Ørnhøj			
2	Anlægsarbejde	729 dage	ma 05-08-19	to 29-09-22
3	Anlægsstart	5 dage	ma 02-09-19	fr 06-09-19
4	Etape 1	92 dage	ma 09-09-19	ti 28-01-20
20	Etape 2	68 dage	ma 27-01-20	on 06-05-20
21	Søndermarksvej	46 dage	ma 27-01-20	ma 30-03-20
28	Søndertoften	25 dage	ti 25-02-20	ma 30-03-20
33	Søndervang Øst	32 dage	ti 17-03-20	on 06-05-20
38	Etape 3	117 dage	ma 23-03-20	ti 29-09-20
39	Hovedgaden øst	90 dage	ma 23-03-20	fr 21-08-20
57	Nedergårdsvej	59 dage	to 18-06-20	ti 29-09-20
66	Skjernvej	15 dage	on 12-08-20	ti 01-09-20
70	Etape 4A - Bassin Mosevænget	50 dage	ma 17-02-20	fr 01-05-20
71	Etape 4B - Oprensning af eksis. Bassin og udløbsledning	20 dage	ma 16-11-20	fr 11-12-20
72	Etape 4C - Vads Dal og Bassin	50 dage	ma 17-08-20	fr 23-10-20
73	Etape 5 - Marken v Halkjærvej	20 dage	ma 10-02-20	fr 06-03-20
74	Etape 5 - Nordtoften	20 dage	on 02-09-20	ti 29-09-20
75	Etape 5 - Fabriksvej	35 dage	on 30-09-20	ti 17-11-20
76	Etape 6 - Raunsbjergvej med sidegader	115 dage	on 18-11-20	ti 25-05-21
77	Etape 7 - Hovedgaden, Kjærsvej, Halkjærvej + boldbane	70 dage	on 26-05-21	ti 21-09-21
78	Etape 8 - Mosevænget nord + pst.	15 dage	ti 05-10-21	ma 25-10-21
79	Etape 8 - Mosevænget syd	60 dage	ti 26-10-21	ma 31-01-22
80	Etape 9 - Banevænget øst og Søndervang	30 dage	ti 01-02-22	ma 14-03-22
81	Etape 10 - Banevænget vest	10 dage	ti 15-03-22	ma 28-03-22
82	Etape 11 - Vesterled og Vestervænget	49 dage	ti 29-03-22	fr 10-06-22
83	Etape 12 - Regnvandsledning i mark v. Fasanvej	30 dage	ma 13-06-22	fr 12-08-22
84	Etape 12 - Bassin overgårdvej vest	20 dage	ma 15-08-22	fr 09-09-22
85	Etape 12 - Bassin Overgårdsvej øst + krossanlæg	20 dage	ma 12-09-22	fr 07-10-22
86	Aflevering	5 dage	ma 10-10-22	fr 14-10-22

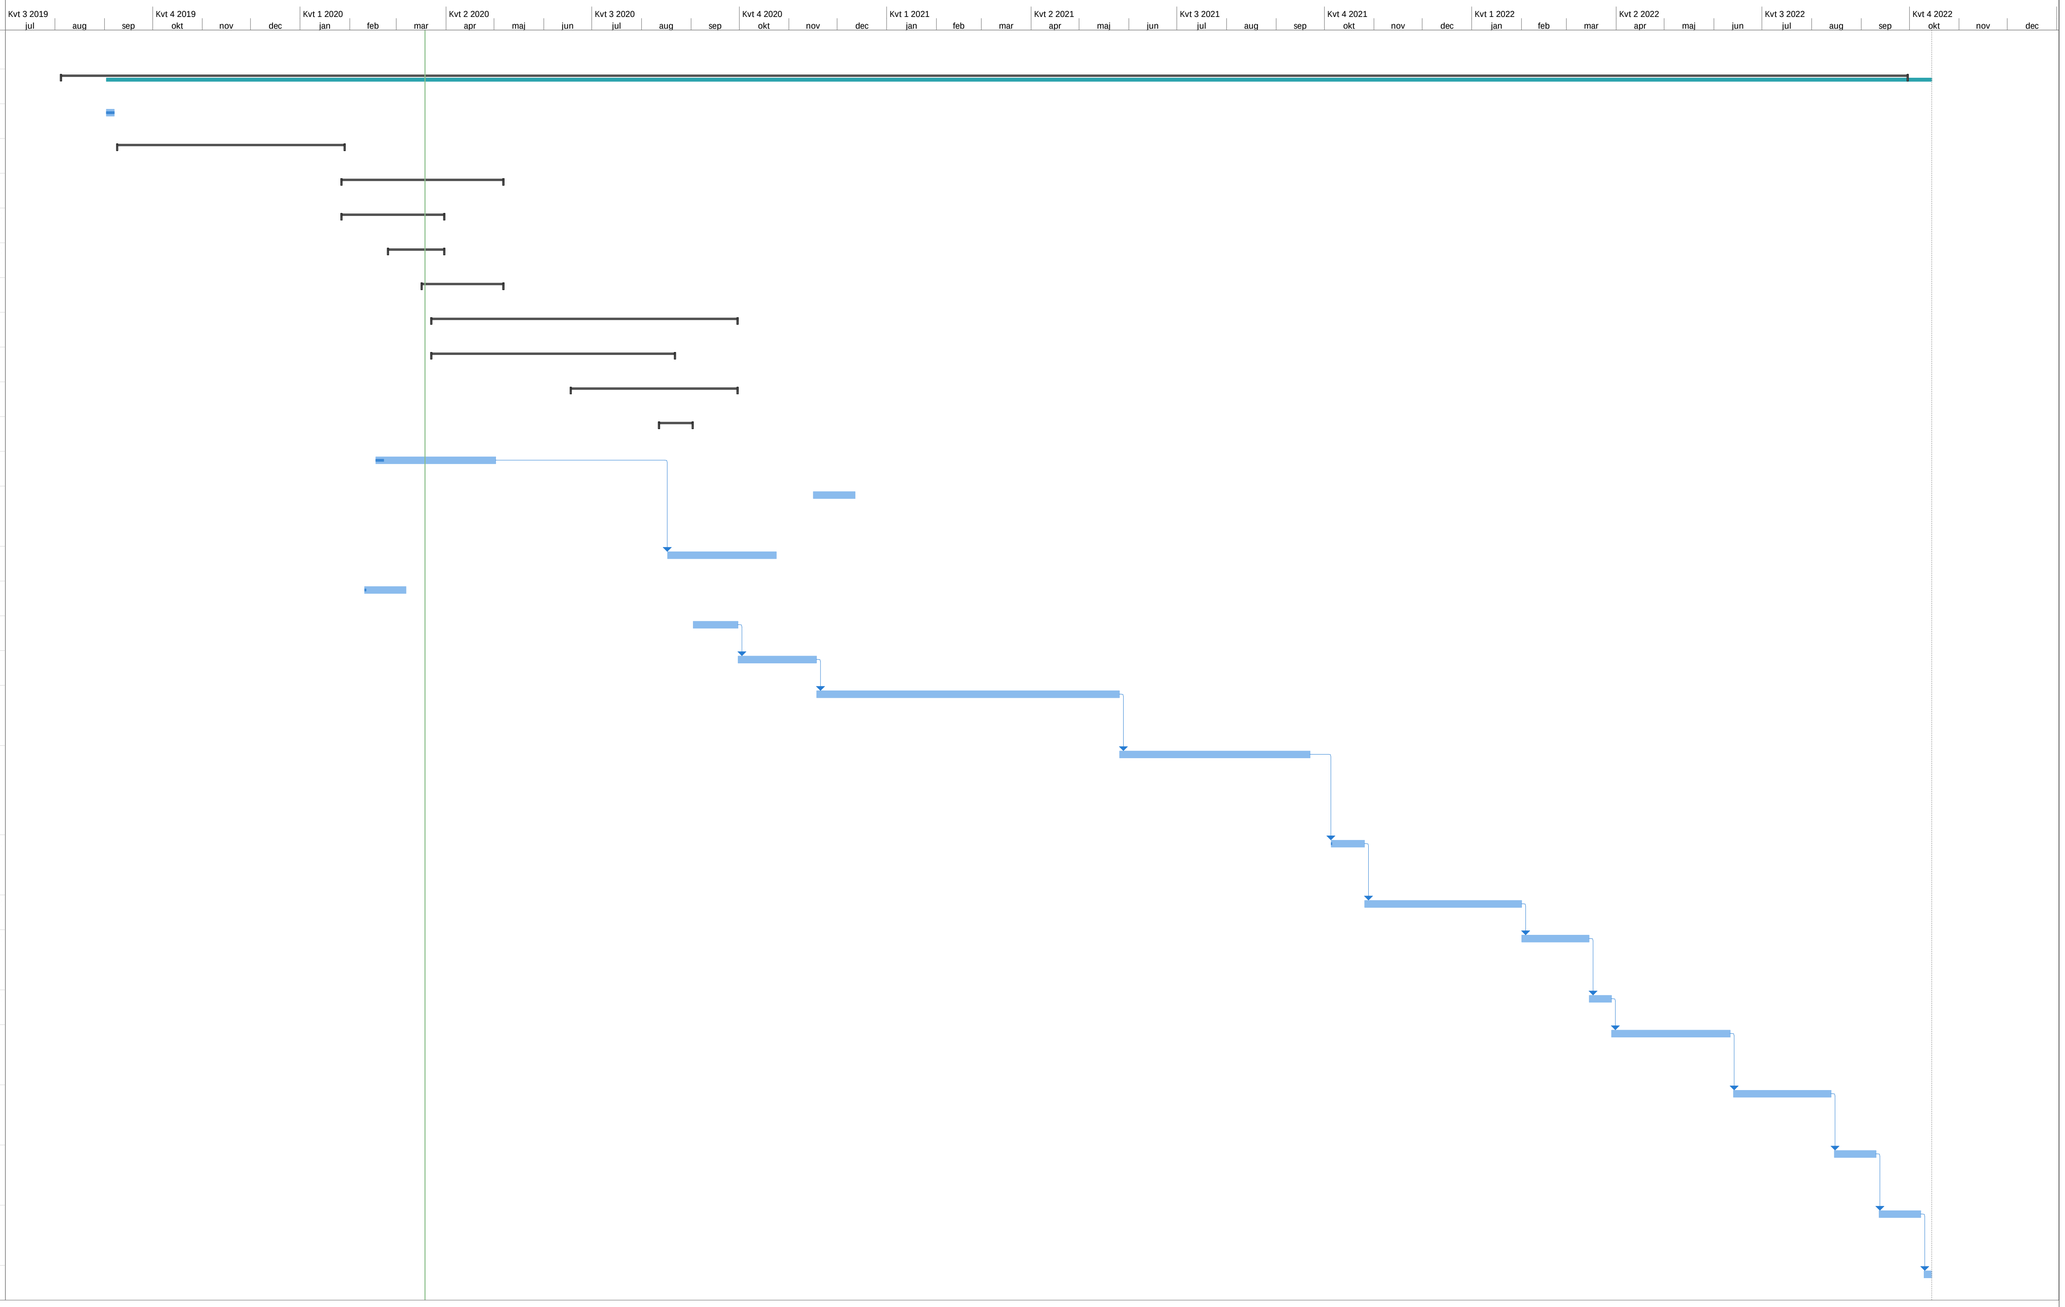

Projekt: Anlægstidsplan Ørnhø
Dato: to 19-03-20

Opgave | Milepæl | Projektoversigt | Inaktiv milepæl | Manuel opgave | Manuel oversigtsopløftning | kun start | Eksterne opgaver | Deadline | Manuel status
Opdeling | Hovedopgave | Inaktiv opgave | Inaktiv oversigt | Kun varighed | Manuel oversigt | Kun slutdato | Ekstern milepæl | Fremdrift
